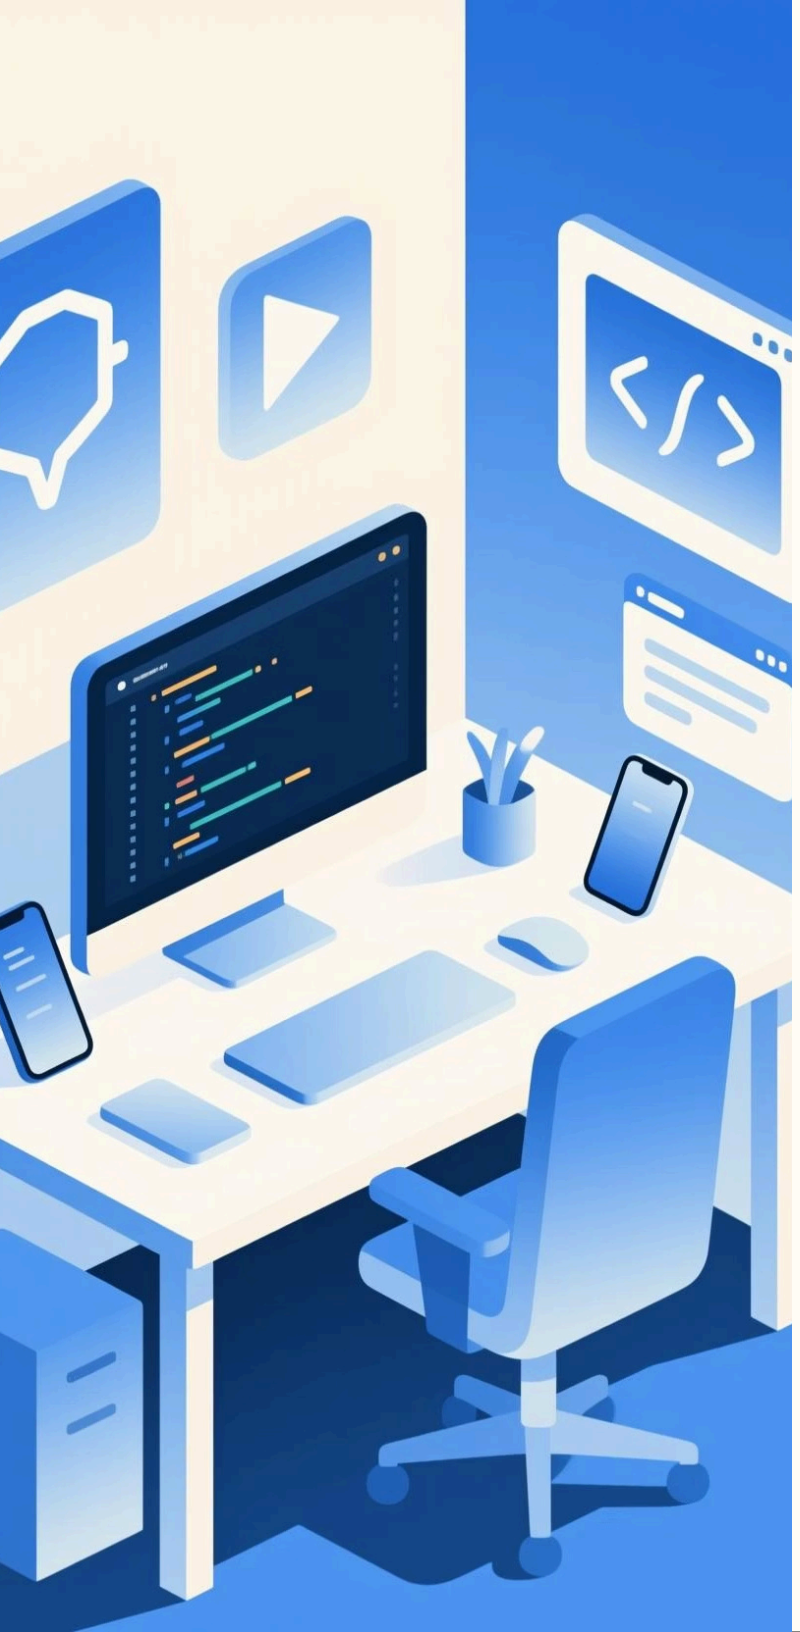

Cotización – Funcionalidades Adicionales

Proyecto: Aplicación Móvil Carini

Cliente: CARINI SAS | **NIT:** 900.635.489-8

Desarrollador: Joiner Antonio Dávila Saiz - C.C. 1.141.515.075

Made with GAMMA

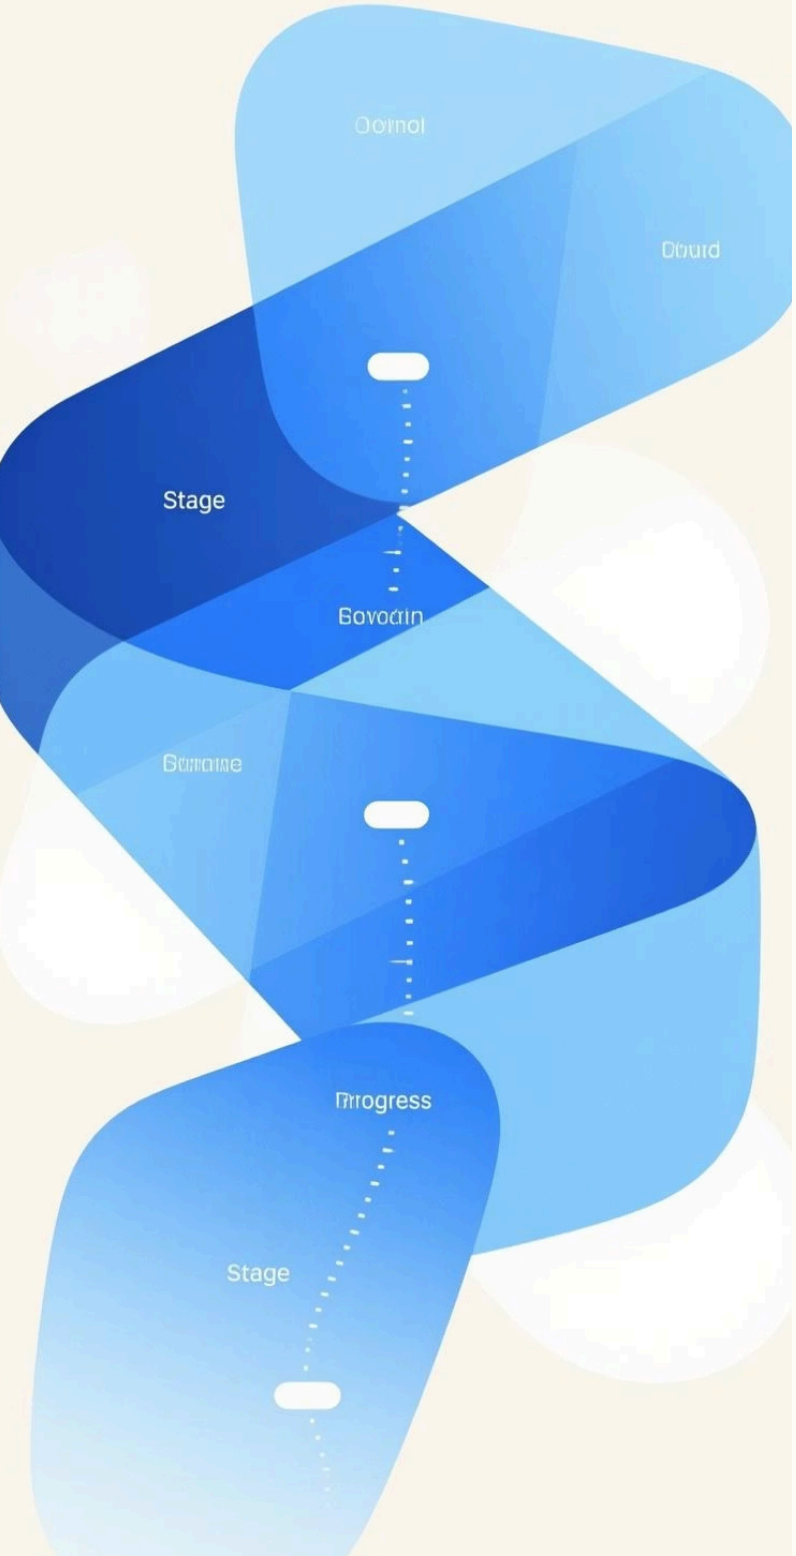

Situación Actual del Proyecto

Contrato Original

Valor: $7.050.000 COP

Fecha: 11 de Junio, 2025

Alcance: App básica con 3 roles + Backend + Sitio Web

Estado de Pagos

✅ **Pagado:** $3.525.000

(50% inicial - Junio 2025)

⏳ **Pendiente:** $3.525.000

(50% final - No pagado)

Durante **varios meses** de desarrollo continuo, se han implementado funcionalidades adicionales significativas sin recibir ningún pago adicional más allá del 50% inicial. Todo el trabajo adicional se desarrolló con la confianza de

Made with GAMMA

Funcionalidades Adicionales Implementadas

Estas funcionalidades **NO estaban contempladas en el contrato original** pero fueron desarrolladas durante el proceso. Todas están implementadas y funcionando:

#	Funcionalidad	Descripción	Valor Técnico (COP)
1	Sistema de Notificaciones Push Completo	Integración con Expo Push Notifications, gestión de tokens, banner en tiempo real	$1.300.000
2	Rol Administrador Completo (4° Rol)	Dashboard administrativo con gestión integral de usuarios y equipos	$2.400.000
3	Mantenimientos Multi-Equipo	Selector múltiple, checklist inteligente, validaciones avanzadas	$800.000
4	Flujo Técnico Avanzado	Timer, GPS activo,	$3.550.000

Made with GAMMA

Análisis Financiero

1. Pendiente del Contrato Original

50% restante: **$3.525.000**

Este monto corresponde al cumplimiento del contrato original firmado en junio de 2025.

2. Trabajo Adicional Desarrollado

Valor técnico: **$12.500.000**

Trabajado durante 4 meses sin recibir pago adicional.

Todas las funcionalidades están implementadas y funcionando.

Valor con 40% de descuento aplicado: **$7.500.000** (60% de **$12.500.000**)

Made with GAMMA

Propuesta Final

Justificación

Trabajo Sostenido

Se trabajó durante meses sin recibir pagos adicionales al 50% inicial

Valor Técnico Real

El trabajo adicional tiene un valor técnico comprobable de $12.500.000

Alcance Ampliado

Se entregó mucho más de lo contemplado en el contrato original

Funcionalidades Completas

Todas las funcionalidades están terminadas

Propuesta Comercial

50% Pendiente Contrato Original

$3.525.000

Trabajo Adicional (con descuento del 40%)

$7.500.000

$11.025.000 COP

Made with GAMMA

TOTAL PROPUESTA

Alternativas de Pago

Opción A: Pago Único

Total: $11.025.000

- Entrega inmediata del proyecto 100% completo y funcional
- **Descuento adicional del 5% por pago único**

$10.473.750

Opción B: Pago en 2 Cuotas

Primera cuota (inmediata): $7.000.000

- Cubre: 50% contrato + parte del adicional

Segunda cuota (30 días): $4.025.000

- Cubre: Resto del adicional

Comparación de Valores

Concepto	Valor Original	Valor Real Desarrollado	Valor con Descuento
Contrato Base	$7.050.000	$7.050.000	$7.050.000
Funcionalidades Adicionales	$0	$12.500.000	$7.500.000

Made with GAMMA

Alternativas de Pago

Opción A: Pago Único

Total: $11.025.000

- Entrega inmediata del proyecto 100% completo y funcional
- **Descuento adicional del 5% por pago único**

$10.473.750

Opción B: Pago en 2 Cuotas

Primera cuota (inmediata): $7.000.000

- Cubre: 50% contrato + parte del adicional

Segunda cuota (30 días): $4.025.000

- Cubre: Resto del adicional

Comparación de Valores

Concepto	Valor Original	Valor Real Desarrollado	Valor con Descuento
Contrato Base	$7.050.000	$7.050.000	$7.050.000
Funcionalidades Adicionales	$0	$12.500.000	$7.500.000

Made with GAMMA

Valor Agregado Entregado

El cliente recibe una aplicación que **excede** el alcance del contrato original:

4 Roles Completos

vs 3 del contrato original – Se agregó rol de Administrador completo con dashboard

Notificaciones Push

Sistema completo no contemplado originalmente – Integración con Expo y gestión de tokens

Mantenimientos Multi-Equipo

Funcionalidad avanzada no contemplada – Checklist inteligente y validaciones

Flujo Técnico Avanzado

Timer, GPS activo, pausas – vs "actualizar estado" básico del contrato

Tecnico - Informacion adiccional

Se agrega informacion adicional al rol tecnico inluyendo parafiscales y carnet digital

Optimizaciones de Arquitectura

Mejor rendimiento y experiencia de usuario – UI/UX moderna con componentes avanzados

Una inversión que multiplica el valor de su operación

Made with GAMMA
